ISO 9001/2000

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 20.
Iroda és postacím: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.
☎ Tel./Fax: 74/512-312, 512-313
www.kozut-epito.hu E-mail: kozuti.epito@t-online.hu

Tanúsítvány r. száma:
CERT-5192-2007-AQ-BUD-RvA

Megrendelő: Mórágy Község Önkormányzat
Cím: 7165 Mórágy, Alkotmány u. 3.
Adószám: 15417512-2-17
Bankszámla: 11746005-15417512

Létesítmény: Mórágy, belterületi vízrendezés III. ütem
Azonosító: DDOP-5.1.5/B-11-2011-0028

Munkaszám: 729/2012

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS, ÉRTÉKELÉS 2012. november 15.

Szekszárd, 2012. November 15.

Kőműves József
ügyvezető

Általános adatok:

Mórágy Község Önkormányzata a korábbi években megkezdett bel és külterületi vízrendezési munkák folytatásaként - eredményes pályázati forrás bevonásával - a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0028 azonosító számú „Mórágy belterületi vízrendezés III. ütem" elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított 2012. június 5.-én.
A közbeszerzési eljáráson a KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. is indult és azon eredményes részvételével elnyerte a jogot e fejlesztési munkák folytatásához.
Ezzel a Mórágy vízrendezési munkák 2010-2011 években megvalósult II. ütem kivitelezése után a III. ütemű kivitelezést is társaságunk nyerte el.

A vízrendezés III. üteme kizárólag belterületi vízelvezetési létesítmények felújításra irányul.
A közbeszerzés fontosabb adatai:
Műszaki adatok, érintett objektumok:
- Petőfi utcai vízelvezető árok 0+000-0+330 és a 0+385-0+410 között, valamint a Petőfi utcai oldalág szabályozása, a korábban elkészült vápás vízlevezető bekötése.
Feladat: a vízelvezető árokból a vad növényzet eltávolítása, a meder vízszintes és magassági rendezése, tisztító kotrása, a mederszelvény kialakítása, a meder burkolása.
- Petőfi utcában a felújításban érintett szakaszon 14 darab műtárgy, útátjáró és kapubejáró felújítása, az átereszek tisztítása, mederburkolása és szerkezeti felújítása. A felújítás során a környezetbe illő módon az eredeti szerkezet és alkalmazott anyagok mint látszó felületek megtartása fontos szempont volt.
- Kossuth utcai vízlevezető I. sz. mellékágának felújítása, burkolása az érintett útburkolat javításával együtt.
- Kossuth utcai vízelvezető II. mellékágának szabályozása, műtárgyainak és burkolatának kiépítése, a Kossuth utca útburkolatának és a csatlakozó vízgyűjtő bekötése a Kossuth utcai vízfolyásba.
- Kossuth utcai vízelvezető felett átvezető közúti hidak felújítása, átépítése, valamint a fenékműtárgyak kiépítése összesen 5 db műtárgy.

A felújítással érintett mederhossz:
- *Petőfi utca: 435 fm*
- *Kossuth utca: 548 fm*
- *Kossuth utcai mellékágak: 110 fm*
- *Mederkotrás mennyisége: 3.700 m3*
- *Mederburkolat építése: 1050 m2*
- *Fenékműtárgyak, bukók és hordalékfogók: 4 db*
- *Felújított átereszek és kishidak: 11 db*

A kivitelezés ütemezése:
A támogatási szerződés az építtető részére és így a kivitelező számára is szigorú feltételeket szabott a megvalósulás tervezett végrehajtására és a nyomon követés biztosítására.
A kivitelezés megkezdése előtt pontos ütemterv készült a határidőben történő teljesítés biztosítására.

I. elszámolási időszak 2012. július 23- augusztus 30.

Megvalósult a Petőfi utcai vízelvezető árok előkészítő munkáinak 100 %-a a földmunkák, meder rendezések 95%-a, megkezdődött a mederburkolat építése.
Összesített teljesítés 54 %-os
Megvalósult valamennyi Petőfi utcai keresztező műtárgy, híd és áteresz szerkezeti felújítása. Ezen műtárgyak készültségi szintje 95-100% közötti.
Elkészült a Kossuth utcai árok II. számú mellékág a csatlakozó meder kőszóráson kívül. Készültségi szintje 85 %-os
Elkészült a Kossuth utcai árok 0+283 szelvényben a fenéklépcső kivitelezése.
Készültségi fok: 100 %
Elkészült a Kossuth utcai árok 0+320-345 szelvények közötti műtárgy és árokburkolat.
Készültségi fok: 100 %
Jelentős mértékben előrehaladott állapotig elkészült a Kossuth utcai árok 0+548 szelvényben a fenékműtárgy, hordalékfogó.
Készültségi fok: 72 %
Elkészült a Kossuth utcai árok felett átvezető 0+633 szelvényben épülő műtárgy és csatlakozó mederműtárgy szerkezeti része az útburkolat helyreállításán kívül.
Készültségi fok: 80 %

Az első elszámolási ütemben elért készültségi szint összevont értéke: 67%

II. elszámolási időszak 2012. augusztus 30 – szeptember 30.

Tovább folytatódott, illetve gyakorlatilag befejeződött a Petőfi utcai vízlevezető árok burkolása, a hozzá kapcsolódó területek rendezésével együtt
Itt a vízlevezető árok teljes hosszban készült előre gyártott beton mederlapok, beton ágyazattal, illetve koszorúval új árokburkolat.
Összesített készültségi fok: 98, %

Folytatódtak, illetve gyakorlatilag néhány kisjelentőségű befejező munkán kívül be is fejeződtek a Petőfi utcai műtárgyak építési munkái.
Készültségi fok: 100 %

Megkezdődött a Kossuth utca I. sz. mellékág kivitelezése, amelynek során a Kossuth utca érintett útburkolatát a mellette húzódó árokburkolatot és műtárgyat el kellett bontani, és új beton burkolattal rendelkező árokburkolatot kellett készíteni indító műtárggyal, és fogadó aknával.
Ebben az elszámolási időszakban az előkészítési, a bontási munkák készültek el, megkezdődött a csapadékvíz elvezető burkolása, és elkészült a csatlakozó burkolat alaprétege.
Készültségi fok: 69 %

Folytatódott a Kossuth utcai II. számú mellékágban a vízelvezető építése, illetve elkészült a csatlakozó meder kőszórása.
Készültségi szint: 99 %

Megkezdődött és elkészült a Kossuth utca 0+250 szelvényben lévő híd javítási munkái, a meder tisztítása és a műtárgy sérüléseinek javítása.
Készültségi fok: 100 %

Megkezdődött és gyakorlatilag be is fejeződött a Kossuth utca 0+395 szelvényben lévő fenékműtárgy, fenéklépcső építése.
Készültségi fok: 99 %

Folytatódott és befejeződött a Kossuth utca 0+548 szelvényben lévő fenékműtárgy, fenéklépcső építése.
Készültségi fok: 100 %

Folytatódott a Kossuth utca 0+633 szelvényben lévő híd átépítése, ebben az időszakban az útburkolat beton alaprétege épült meg.
Készültségi fok: 82 %

A második elszámolási ütemben elért készültségi szint összevont értéke: 82 %

<u>III. elszámolási időszak (végelszámolás) 2012. szeptember 30 – november 15. :</u>

Ebben a fázisban már a befejező munkákat ütemeztük valamennyi műtárgy és építmény esetében.

Befejeződött a Petőfi utcai árok építés valamennyi munkaneme beleértve a rézsűk és környező területek füvesítését is.
Készültségi fok: 100 %

Ellenőrzésre kerültek a Petőfi utcai műtárgyak és elkészültek azok a kis volumenű munkák, felületi javítások amelyek még felmerültek.

Készültségi fok már a második elszámolási ütemben 100 % volt, így ez értelemszerűen nem változott.

Befejeződött a Kossuth utcai I. sz. mellékág mederburkolása és a csatlakozó útburkolat építési munkái.
Készültségi fok: 100 %

Ellenőrzésre kerültek a Kossuth utcai fenékműtárgyak és elkészültek mindazon felmerülő munkák amelyek a műtárgyakon és környezetükben felmerültek.
Készültségi fok valamennyi műtárgy esetében: 100 %

Befejeződött a Kossuth utca 0+633 szelvényben a keresztező híd építése.
Ebben a fázisban a híd aszfaltburkolata, a hídkorlát és a csatlakozó mederburkolat befejezése készült el.
Készültségi fok: 100 %

Összességében a Mórágy, belterületi vízrendezési munkák kivitelezését a kivitelező KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. a rendelkezésére bocsájtott tervek és hatósági engedélyek szerint, a vállalt határidőre jó minőségben teljesítette.

Melléklet: építést megelőző és felújítás utáni fényképek

Fotómellékletek:

Petőfi utcai vízelvezető a felújítás előtt:

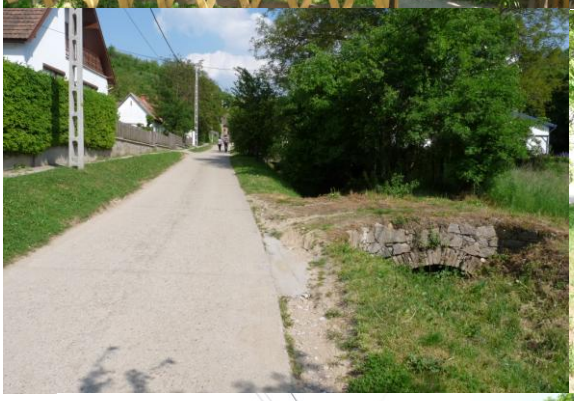

Petőfi utcai vízelvezető a felújítás után:

Kossuth utcai árok és mellékágai a felújítás előtt:

Kossuth utcai árok és mellékágai a felújítás után:
